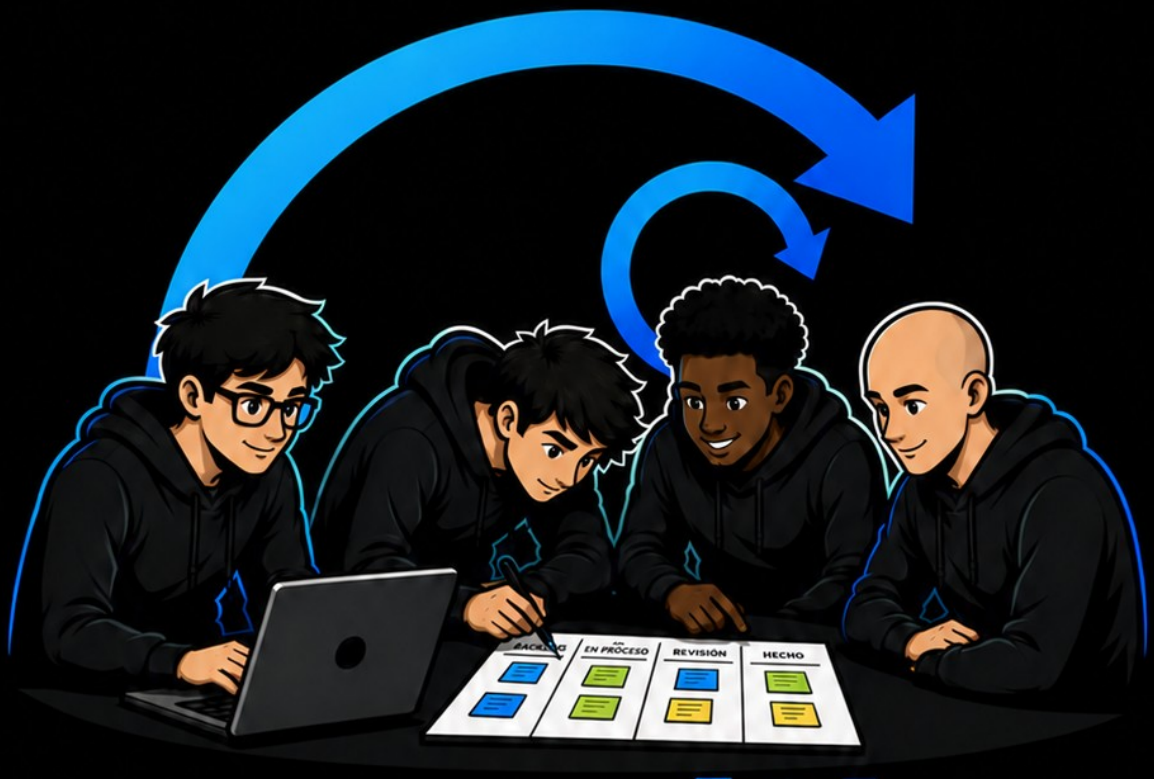


scrumáticos

PLANIFICAMOS | COLABORAMOS | ADAPTAMOS | ENTREGAMOS VALOR

Institución
EPET 20

Asignatura
Calidad de software

Docente o Product Owner
Alejandro Zeballos

Sprints
1 y 2

Repositorio
https://github.com/Lautaa18/Scrumaticos

Contenido

Si el índice aparece vacío en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campo.

1. Presentación del proyecto

El proyecto consiste en un portal web educativo sobre gestión de la calidad del software, procesos de desarrollo (tradicionales y ágiles) y las metodologías más usadas en la industria. Está pensado para estudiantes y profesionales en formación: reúne contenido teórico claro, ejemplos y herramientas interactivas, como un comparador de metodologías y una encuesta que sugiere la metodología más adecuada para un proyecto.

El sitio se construye con HTML, CSS y JavaScript, sin frameworks, y se organiza con Scrum en sprints. En este documento registramos la organización del equipo, el Product Backlog, la planificación y el seguimiento de cada sprint, el tablero de trabajo, los gráficos de burndown, las pruebas y las revisiones.

1.1 Equipo y roles

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad principal
Gonzalo	Scrum Master	Organiza el tablero, modera las ceremonias, mide la velocidad y desbloquea al equipo.
Lautaro Zeballos	Programador / Dev	Maquetación HTML/CSS y lógica JavaScript de cada historia.
Ezequiel Acuña	Diseñador / UX-UI	Prototipos en Figma, guía de estilos, paleta y accesibilidad.
Benjamín Lara	Tester / QA	Plan de pruebas, ejecución, reporte de defectos y validación del DoD.
Alejandro Zeballos	Product Owner	Docente. Prioriza el Product Backlog y acepta las historias en la Sprint Review.

1.2 Herramientas de trabajo

- **Tablero:** Trello, con las columnas Product Backlog, To Do, In Progress, QA y Done (ver sección 5).
- **Repositorio:** https://github.com/Lautaa18/Scrumaticos (rama master).
- **Diseño:** prototipo en Figma Make y guía de identidad visual (sección 8).
- **Seguimiento:** planilla Burndown-SCrumaticos.xlsx, que calcula el burndown a partir de la fecha en que cada historia cumple el DoD.
- **Pruebas:** plan de pruebas por historia (Benjamín) y verificación automatizada con Playwright para regresión.

2. Product Backlog

El Product Backlog tiene 19 historias de usuario tomadas de la consigna del Proyecto SGCS 2026. Cada historia se estima en puntos de historia y se asigna a un sprint. El detalle de los requerimientos de Diseño/CSS, JS y QA de cada historia está en el Anexo A.

ID	Historia de usuario	Sección	Puntos	Sprint
US-01	Página de Inicio e Introducción General	Inicio	240	1
US-02	Fundamentos de	Gestión de la Calidad	200	1

ID	Historia de usuario	Sección	Puntos	Sprint
	Calidad (ISO 9126 / 25000)			
US-03	Técnicas de Aseguramiento de la Calidad	Gestión de la Calidad	200	2
US-04	Herramientas de Calidad	Gestión de la Calidad	220	2
US-05	Ciclo de Vida del Software (SDLC)	Procesos de Desarrollo	220	2
US-06	Modelos Tradicionales	Procesos de Desarrollo	170	2
US-07	Ilustraciones de Modelos Tradicionales	Procesos de Desarrollo	180	2
US-08	Metodologías Ágiles (índice de contenidos)	Procesos de Desarrollo	230	1
US-09	Ilustraciones de Metodologías Ágiles	Procesos de Desarrollo	150	2
US-10	Sección Profunda de Scrum	Metodologías en Detalle	260	2
US-11	Sección Profunda de Kanban	Metodologías en Detalle	280	2
US-12	Glosario Interactivo	Recursos y Aprendizaje	210	2
US-13	Preguntas Frecuentes (FAQ)	Recursos y Aprendizaje	150	1
US-14	Enlaces de Interés	Recursos y Aprendizaje	130	2
US-15	Ejercicios y Casos Prácticos	Recursos y Aprendizaje	160	2
US-16	Sobre Nosotros	Secciones Adicionales	160	1
US-17	Formulario de Contacto	Secciones Adicionales	220	1
US-18	Comparador Interactivo de Metodologías	Funcionalidad JS	380	2
US-19	Encuesta de Preferencias Metodológicas	Funcionalidad JS	400	2
	Total		**4160**	

Supuesto a confirmar: la entrega anterior del Sprint 1 no tenía puntos. Los estimamos con la misma escala que usa la Pila del Sprint 2 (de 130 a 400 puntos según el tamaño y la complejidad de JavaScript), y dan 1200 puntos

para el Sprint 1.

2.1 Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todo lo siguiente:

- El Diseñador aprobó el maquetado según el prototipo y la paleta del proyecto.
- El Programador integró la lógica en JavaScript y el código está en el repositorio.
- El Tester ejecutó todos los casos del plan de pruebas y no quedan casos desaprobados sin corregir. Si cambia un resultado esperado, se registra el motivo y quién lo aprobó.
- Funciona en escritorio (1280 px), tablet (768 px) y celular (375 px), y con teclado, sin errores en la consola.
- La tarjeta de Trello tiene responsable, checklist completo, evidencia (captura y commit) y el Scrum Master la movió a Done.
- El Product Owner la acepta en la Sprint Review.

3. Sprint 1 (corregido)

Esta sección reemplaza la entrega anterior del Sprint 1. Se mantienen los hechos registrados en la bitácora, el plan de pruebas y el historial de Git, y se completan los artefactos de Scrum que faltaban. El detalle de los cambios está en la sección 3.8.

3.1 Sprint Planning

Dato	Valor
Fechas	11/09/2026 al 16/10/2026 (26 días hábiles)
Objetivo del sprint	Publicar la base navegable del portal: inicio con menú, Fundamentos con estándares ISO, Metodologías ágiles con índice, Preguntas frecuentes, Sobre nosotros y Contacto, funcionando en computadora, tablet y celular.
Historias comprometidas	6 historias, 1200 puntos
Scrum Master	Gonzalo
Product Owner	Alejandro Zeballos (docente)

ID	Historia	Pts	Tareas por rol	Responsables
US-01	Página de Inicio e Introducción General	240	Diseño: Maquetación de la portada (Hero section) con estructura responsive (Flexbox/Grid), paleta ... JS: Control del menú de navegación interactivo (menú hamburguesa dinámico en dispositivos móvi... QA: plan y ejecución de casos	Ezequiel · Lautaro · Benjamín
US-02	Fundamentos de Calidad (ISO 9126 / 25000)	200	Diseño: Maquetación de contenido textual estructurado con tipografía legible, listas informativas ... JS: Implementación de pestañas (tabs) o acordeón dinámico para organizar los estándares (ISO 9... QA: plan y ejecución de casos	Ezequiel · Lautaro · Benjamín
US-08	Metodologías Ágiles (índice de contenidos)	230	Diseño: Maquetación modular por metodología (Scrum, Kanban, XP) destacando los 4 valores y 12 prin...	Ezequiel · Lautaro · Benjamín

ID	Historia	Pts	Tareas por rol	Responsables
			JS: Menú flotante o tabla de contenidos dinámica para saltar de forma fluida a los apartados d… QA: plan y ejecución de casos	
US-13	Preguntas Frecuentes (FAQ)	150	Diseño: Maquetación de interfaz tipo acordeón interactivo. … JS: Lógica de apertura/cierre de respuestas mediante eventos de clic con animación fluida de a… QA: plan y ejecución de casos	Ezequiel · Lautaro · Benjamín
US-16	Sobre Nosotros	160	Diseño: Layout de tarjetas de perfil para cada integrante del equipo (roles Scrum Master, Diseñado… JS: Efectos interactivos al pasar el cursor (hover) sobre los perfiles.… QA: plan y ejecución de casos	Ezequiel · Lautaro · Benjamín
US-17	Formulario de Contacto	220	Diseño: Formulario accesible con etiquetas <label> vinculadas a cada campo (input, textarea).… JS: Validación del lado del cliente antes del envío (validación de campos obligatorios, format… QA: plan y ejecución de casos	Ezequiel · Lautaro · Benjamín


3.2 Daily Scrum (bitácora del sprint)

Las dailies se registraron con las tres preguntas de Scrum. Se transcriben tal como quedaron en la bitácora; los días sin fila no tienen registro.

Fecha	Quién	¿Qué hice?	¿Qué voy a hacer?	Impedimentos
11/09	Benjamín (Tester)	—	—	No asistió a la reunión.
11/09	Ezequiel (Diseñador)	Organizamos las historias con el equipo y empecé el diseño del	Terminar el diseño del inicio.	Necesita hablar con el programador sobre cómo se

Fecha	Quién	¿Qué hice?	¿Qué voy a hacer?	Impedimentos
		inicio.		implementará el diseño.
11/09	Lautaro (Programador)	Sin avances.	Ayudar con el diseño para empezar a programar.	Ninguno.
22/09	Ezequiel, Lautaro, Benjamín	Revisión del diseño y consultas.	Ajustar el diseño.	La propuesta de diseño no se aprobó.
25/09	Equipo	Diseño aprobado. Se suben las primeras páginas (commits a9d080b, 66b08f8, e9afae8).	Continuar con la programación.	Ninguno.
29/09	Tester, Programador, Diseñador	Pruebas en conjunto con resultado satisfactorio.	Formalizar los casos de prueba.	Ninguno.
01/10	Benjamín (Tester)	Casos de prueba de US-01.	Casos de US-02.	Ninguno.
02/10	Equipo	No hubo clases. Apoyo al tester.	—	Ausencia institucional.
06/10	Benjamín (Tester)	Casos de prueba de US-02.	Seguir con las demás historias.	Ninguno.
12/10	Ezequiel (Diseñador)	Trabajo conjunto con tester y programador.	Acompañar al equipo; diseño terminado.	Ninguno.
12/10	Lautaro (Programador)	Ayudó al tester y al diseñador.	Seguir asesorando.	Ninguno; tareas asignadas terminadas.
12/10	Benjamín (Tester)	Planificó los casos de US-08 y US-13.	Ejecutar ambas pruebas.	Dificultad para planificar casos.
15/10	Benjamín (Tester)	Plan de pruebas de US-13.	Planificar y ejecutar US-16.	Ninguno.
16/10	Benjamín (Tester)	Pruebas de US-16 y US-17 completas.	Acompañar al equipo.	Ninguno.
16/10	Lautaro (Programador)	Correcciones de QA: footer, FAQ, celular, títulos e institución (dfb5add, c1d20e3, 730d734, 12137c4).	—	—

3.3 Burndown del Sprint 1

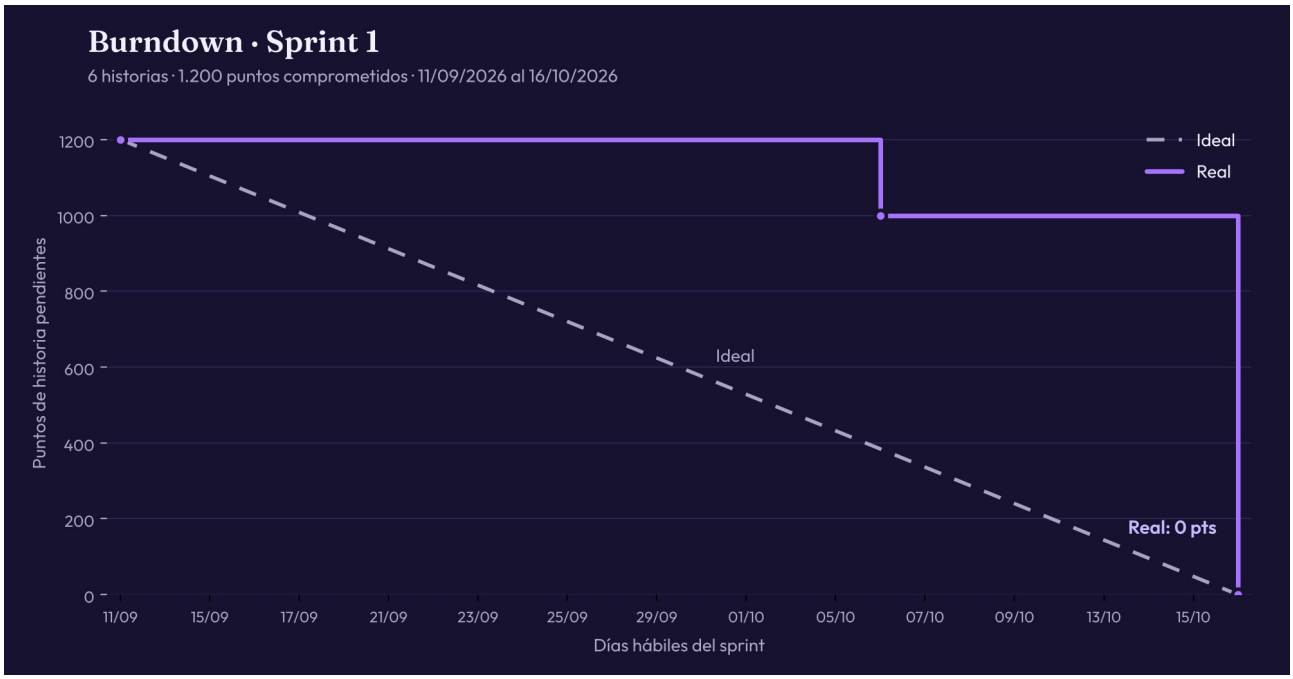

Puntos pendientes por día hábil. La línea real baja cuando una historia cumple el DoD.

Lectura del gráfico: durante 17 de los 26 días hábiles no se terminó ninguna historia. US-02 cumplió el DoD el 06/10 y las otras cinco historias recién el último día (16/10), cuando se corrigieron los defectos de QA y se creó la página de preguntas frecuentes. El sprint cerró con los 1200 puntos terminados, pero el trabajo se concentró al final: el principal riesgo que muestra el burndown es que el equipo trabajó en cascada dentro del sprint (primero todo el diseño, después la programación, al final las pruebas).


ID	Puntos	Fecha DoD	Evidencia
US-02	200	06/10/2026	17/17 casos aprobados en la primera ejecución.
US-01	240	16/10/2026	24 casos; US1-18 cerrado con el footer nuevo (commit dfb5add).
US-08	230	16/10/2026	17 casos; US8-15 y US8-16 corregidos en c1d20e3.
US-13	150	16/10/2026	12 casos; la página faq.html se creó en c1d20e3.
US-16	160	16/10/2026	10 casos; US16-8 corregido; institución agregada en 12137c4.
US-17	220	16/10/2026	14/14 casos aprobados.

3.4 Tablero del Sprint 1

Al cierre del sprint las seis tarjetas del Sprint 1 están en la columna Done, cada una con su checklist de tareas por rol, la fecha de vencimiento del sprint y una captura del sitio como evidencia. Las capturas de cada historia son:



US-01 · Página de Inicio e Introducción General



US-02 · Fundamentos de Calidad (ISO 9126 / 25000)




US-08 · Metodologías Ágiles (índice de contenidos)



US-13 · Preguntas Frecuentes (FAQ)



US-16 · Sobre Nosotros



US-17 · Formulario de Contacto

3.5 Pruebas del Sprint 1

Historia	Casos	Aprobados en la 1.ª ejecución	Desaprobados	Corrección
US-01	24	23	1	US1-18: el footer cambió por decisión de diseño; se actualizó el esperado (aprobado por Ezequiel).
US-02	17	17	0	—
US-08	17	15	2	Índice y ancho en

Historia	Casos	Aprobados en la 1.ª ejecución	Desaprobados	Corrección
				celular corregidos (c1d20e3).
US-13	12	2	10	La página no existía al probar: se creó faq.html y se repitieron los 10 casos.
US-16	10	8	2	US16-3 (foto quitada por decisión del equipo) y US16-8 (botón de motivación) corregidos.
US-17	14	14	0	—
Total	**94**	**79**	**15**	15 corregidos y re-probados

Re-ejecución de regresión (06/11/2026): para comprobar que el incremento sigue funcionando, se automatizaron 32 casos representativos del plan con Playwright (navegador Chromium, 1280, 768 y 375 px). Resultado: 32 de 32 aprobados. El detalle está en el Anexo B.

3.6 Sprint Review

Fecha: 16/10/2026. Se mostró al Product Owner el incremento: inicio con menú y tarjetas, Fundamentos con pestañas ISO, Metodologías ágiles con índice, Preguntas frecuentes, Sobre nosotros y Contacto. Las seis historias cumplieron el DoD.

Resultado	Detalle
Historias terminadas	6 de 6 (1200 de 1200 puntos)
Velocidad del sprint	1200 puntos
Pendiente para el PO	Definir si el formulario de contacto debe enviar o guardar los mensajes (hoy solo valida y confirma en pantalla).
Aceptación del PO	Completar con la firma o comentario del docente.

3.7 Sprint Retrospective

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal?	¿Qué vamos a mejorar? (acción · responsable)
Todas las historias se terminaron y se corrigieron los 15 defectos encontrados.	El trabajo se concentró al final: 5 de 6 historias terminaron el último día.	Terminar historias de a una: no empezar otra hasta pasar la anterior a QA · Gonzalo
El equipo acompañó al tester en la planificación de casos.	Se probó US-13 antes de que existiera la página.	No pasar una tarjeta a QA sin el commit enlazado · Lautaro y Benjamín
Diseño aprobado con una sola ronda de ajustes.	No hubo puntos, tablero ni burndown durante el sprint.	Actualizar Trello y la planilla de burndown en cada daily · Gonzalo
La bitácora registró las tres preguntas de la daily.	Dailies irregulares (hubo días sin registro y ausencias sin aviso).	Daily de 5 minutos cada día de clase; si alguien falta, avisa por el grupo · Todo el equipo

¿Qué salió bien?	¿Qué salió mal?	¿Qué vamos a mejorar? (acción · responsable)
	Resultados esperados cambiados sin registrar quién lo decidió.	Registrar el motivo y la aprobación en la tabla de desaprobados · Benjamín

3.8 Qué se corrigió respecto de la entrega anterior

Problema en la entrega anterior	Corrección
La portada y el texto decían «sprint 5».	Se identifica como Sprint 1 (las historias US-01, 02, 08, 13, 16 y 17 son las del primer sprint).
No había puntos de historia ni capacidad.	Se estimaron puntos (1200) y se calcula la velocidad.
No había tablero ni burndown.	Tablero de Trello con tarjetas, checklist y evidencias; burndown con datos reales de la bitácora y Git.
La planificación no tenía objetivo medible ni tareas por rol.	Sprint Planning con objetivo, fechas, historias, tareas y responsables.
No había Sprint Review ni Retrospective separadas.	Se agregaron ambas ceremonias con resultados y acciones con responsable.
US1-18 y US16-3 se aprobaron cambiando el resultado esperado sin justificar.	Se registra el motivo (cambio de diseño decidido por el equipo) y quién lo aprobó.
US-13 figuraba con 10 casos desaprobados porque no existía la página.	Se aclara que la página se creó el 16/10 y se repitieron las pruebas.

4. Sprint 2

4.1 Sprint Planning

Dato	Valor
Fechas	19/10/2026 al 13/11/2026 (20 días hábiles) — supuesto, confirmar
Objetivo del sprint	Completar los contenidos del portal y las herramientas interactivas: técnicas y herramientas de calidad, SDLC, modelos tradicionales con ilustraciones, Scrum y Kanban en detalle, glosario, enlaces, ejercicios, comparador y encuesta.
Historias comprometidas	13 historias, 2960 puntos (Pila de Sprint modificada)
Velocidad de referencia	Sprint 1: 1200 puntos

Alerta de capacidad: el equipo comprometió 2960 puntos, 2.5 veces la velocidad del Sprint 1. El Scrum Master debería acordar con el Product Owner qué historias son prioritarias (sugerencia: US-18 y US-19, que son las funcionalidades JavaScript pedidas en la consigna) por si no se llega con todas.

ID	Historia	Pts	Diseño/CSS (Ezequiel)	JS (Lautaro)
US-03	Técnicas de Aseguramiento de la Calidad	200	Maquetación de esquemas gráficos o cuadros comparativos estilizados para diferenciar niveles (Unitarias, Integración, Sistema) y tipos de pruebas (Caja Negra, Caja Blanca).	Tarjetas interactivas desplegables (flip-cards o modales) que muestren detalles adicionales al hacer clic en cada tipo de prueba.
US-04	Herramientas de Calidad	220	Grilla (grid) de tarjetas informativas visualmente atractivas con íconos representativos de cada tipo de herramienta (Bug Trackers, Linters, Test Management).	Sistema de filtrado por categoría de herramienta mediante botones interactivos en tiempo real sin recargar la página.
US-05	Ciclo de Vida del Software (SDLC)	220	Maquetación de una línea de tiempo (timeline) vertical o horizontal que ilustre secuencialmente las etapas del SDLC (Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue, Mantenimiento).	Animación de desplazamiento (scroll smooth) o iluminación paso a paso de las etapas a medida que el usuario interactúa.
US-06	Modelos Tradicionales	170	Estructuración de la información mediante bloques comparativos (Ventajas vs. Desventajas) utilizando	Navegación interna por sub-secciones dentro de la página para alternar rápidamente entre Cascada, Modelo


ID	Historia	Pts	Diseño/CSS (Ezequiel)	JS (Lautaro)
			íconos y cajas con códigos de color (ej. verde/rojo).	en V e Iterativo.
US-07	Ilustraciones de Modelos Tradicionales	180	Optimización de formatos (SVG/WebP) y maquetación de contenedores de imagen adaptables con pie de foto explicativo.	Módulo de vista previa de imágenes en pantalla completa (Lightbox) al hacer clic sobre cualquier diagrama.
US-09	Ilustraciones de Metodologías Ágiles	150	Incorporación de esquemas visuales explicativos (ej. ciclo del Sprint, flujo Kanban, bucle de XP).	Reutilización del script de Lightbox/Galeria modal para ampliación de gráficos.
US-10	Sección Profunda de Scrum	260	Maquetación estructurada por pestañas o bloques temáticos: 1) Roles, 2) Eventos/Ceremonias, 3) Artefactos.	Cronograma o diagrama interactivo del Sprint de 1 a 4 semanas donde el usuario pueda hacer clic en cada evento (Daily, Review, Retro) y ver su duración sugerida y objetivo.
US-11	Sección Profunda de Kanban	280	Maquetación que simule visualmente un tablero Kanban (Por Hacer, En Proceso, Hecho) explicativo con tarjetas informativas.	Demostración interactiva simple (drag-and-drop o botones) que permita al usuario mover una tarjeta didáctica a través de las columnas para entender el límite de WIP (Work in Progress).
US-12	Glosario Interactivo	210	Maquetación de listado alfabético (A-Z) accesible con separadores visuales claros.	Buscador en tiempo real (campo de entrada con filtro dinámico) que filtre las definiciones visibles según lo ingresado por el usuario, más índice interactivo por letras.
US-14	Enlaces de Interés	130	Listado de enlaces maquetados como tarjetas o listas estilizadas con íconos distintivos por tipo de recurso (Web, PDF, Libro, Organización).	Manejo de apertura segura de enlaces.
US-15	Ejercicios y Casos Prácticos	160	Tarjetas de ejercitación con bloques de enunciado y áreas desplegables para la solución/pauta de evaluación.	Botón interactivo "Mostrar/Ocultar Solución" con estado dinámico.
US-18	Comparador Interactivo de Metodologías	380	Formulario de selección por checkboxes y contenedor de tabla	Renderizado dinámico de columnas/filas en la tabla comparativa

ID	Historia	Pts	Diseño/CSS (Ezequiel)	JS (Lautaro)
			adaptativa con bordes e indicadores claros.	mediante lectura de un objeto/arreglo en JS con las características de cada metodología según la selección activa del usuario.
US-19	Encuesta de Preferencias Metodológicas	400	Componente tipo asistente/paso a paso (Wizard) con barra de progreso visual.	Algoritmo de cómputo de puntaje que evalúa las alternativas seleccionadas en el formulario y calcula el porcentaje de coincidencia hacia Scrum, Kanban o Cascada, presentando un resumen final dinámico.

4.2 Tablero del Sprint 2

Las 13 historias están en Trello con su checklist (Diseño/CSS, JS y QA), el sprint indicado en la descripción y la fecha de cierre del sprint. Cada tarjeta avanza To Do → In Progress → QA → Done, y solo el Scrum Master la pasa a Done después de la aprobación del tester.

4.3 Burndown del Sprint 2

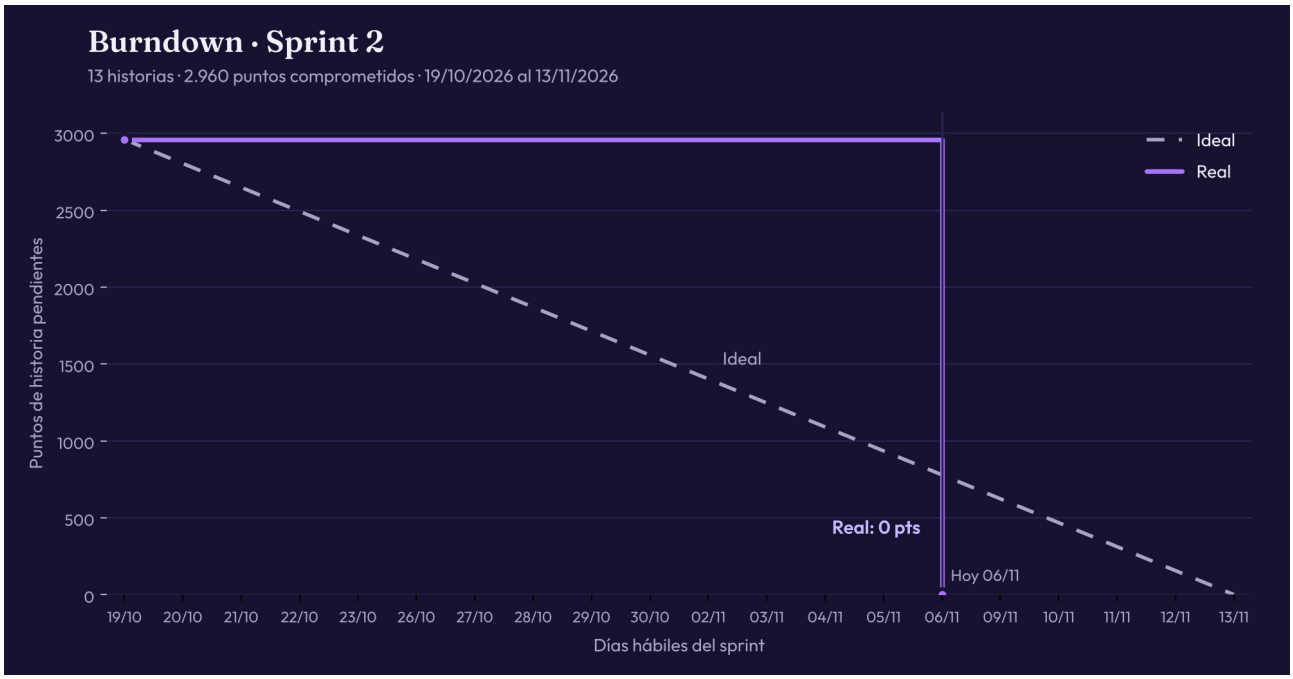

Puntos pendientes al 06/11/2026. Los días siguientes se completan en la planilla de burndown.

Al 06/11/2026 las 13 historias (2960 puntos) cumplen el DoD. La línea real queda plana hasta el 06/11 porque el código de todas las historias se integró y probó ese día: durante tres semanas el trabajo estuvo solo en el prototipo de Figma. Es el problema que muestra el burndown: el equipo no integró historias chicas a lo largo del sprint, y lo marca como acción para el próximo sprint.

4.4 Plan de pruebas del Sprint 2

Historia	Casos	Aprobados	Desaprobados	Pendientes
US-03	10	10	0	0
US-04	11	11	0	0
US-05	9	9	0	0
US-06	10	10	0	0
US-07	9	9	0	0
US-09	9	9	0	0
US-10	14	14	0	0
US-11	11	11	0	0
US-12	12	12	0	0
US-14	7	6	0	1
US-15	8	8	0	0
US-18	12	12	0	0
US-19	13	13	0	0
Total	135	134	0	1

Ejecución del 06/11/2026 con Playwright (Chromium) a 1920, 1280, 768 y 375 px, con mouse, teclado y toque. US14-6 (enlaces rotos) queda pendiente de prueba manual porque el entorno de prueba no tenía salida a internet. El detalle de cada caso está en el Anexo C.

Defectos encontrados y corregidos durante la ejecución:

ID	Problema	Corrección	Resultado tras corregir
US7-6	El Lightbox mostraba el diagrama más chico que en la página (446 px contra 531 px).	En css/styles.css la figura del Lightbox pasa de max-width a width: min(1200px, 100%).	Aprobado: la imagen se amplía a 1200 px.
US12-3	Al buscar «sprint» aparecían 6 términos porque se buscaba también en las definiciones.	En js/glosario.js el filtro busca solo en el nombre del término.	Aprobado: aparece solo Sprint con su definición.

El plan completo con entradas y resultados esperados es el documento «Plan de Prueba – Pila de Sprint N2»; sus columnas Resultado obtenido y ¿Pasó la prueba? se completan con el Anexo C.



US-10: Scrum en detalle con el diagrama interactivo del Sprint.



US-11: tablero Kanban con límite WIP.



US-18: comparador de metodologías.



US-19: encuesta con barra de progreso.

4.5 Sprint Review y Retrospective

Ceremonia	Registro
Sprint Review (a realizar con el PO)	Se presentan las 13 historias (2960 puntos) funcionando en el sitio, con 134 de 135 casos aprobados y US14-6 para verificar en la demo abriendo cada enlace. Queda pendiente la aceptación del Product Owner.
Qué salió bien	Las 13 historias quedaron programadas y probadas; los dos defectos encontrados (US7-6 y US12-3) se corrigieron y volvieron a probar el mismo día.
Qué salió mal	Se comprometieron 2,5 veces la velocidad del Sprint 1 y el

Ceremonia	Registro
	código se integró recién al final: el burndown quedó plano tres semanas.
Acciones para el próximo sprint	Comprometer como máximo la velocidad promedio · Gonzalo. Integrar y probar cada historia apenas se termina, no al final · Lautaro y Benjamín. Mover las tarjetas de Trello en cada daily · todo el equipo.

5. Tablero de Trello


El tablero «SCrumáticos · Proyecto SGCS 2026» tiene estas columnas: Info del proyecto, Product Backlog, To Do (Sprint Backlog), In Progress, QA y Done. Cada historia es una tarjeta con:

- Título con el ID, el nombre y los puntos, por ejemplo «US-10 · Sección Profunda de Scrum (260 pts)».
- Descripción con la historia de usuario, sus criterios de aceptación y el DoD.
- El sprint al que pertenece, indicado en la descripción.
- Checklist con una tarea por rol (Diseño/CSS, JS y QA), tildada al terminar.
- Fecha de vencimiento del sprint y el resultado de las pruebas como evidencia al pasar a Done.

La columna Info del proyecto reúne el objetivo y el equipo, el DoD, los burndown de cada sprint y el gráfico de velocidad.

Enlace al tablero: https://trello.com/b/37CLmRQU

6. Métricas del proyecto

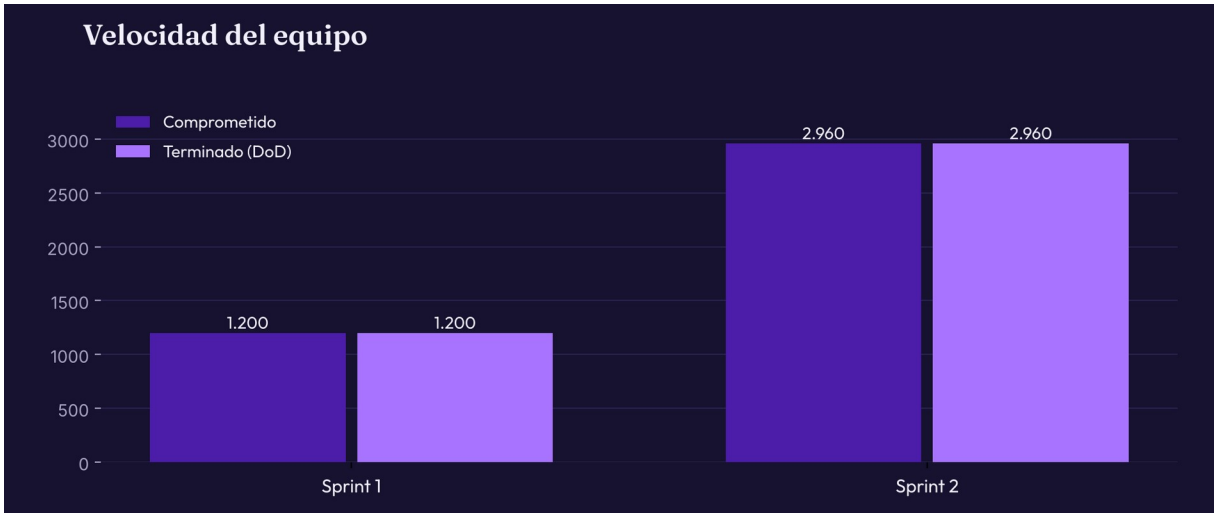

Puntos comprometidos y terminados por sprint.

Sprint	Comprometido	Terminado	Cumplimiento	Defectos encontrados	Defectos corregidos
Sprint 1	1200	1200	100 %	15	15
Sprint 2	2960	2960	100 %	2	2

7. Repositorio y control de versiones

Código fuente: https://github.com/Lautaa18/Scrumaticos. Historial de la rama master:

Commit	Fecha	Autor	Cambio
12137c4	16/10/2026	Lautaa18	Corrijo orden de títulos en ágiles y agrego campo institución en perfiles
730d734	16/10/2026	Lautaa18	Saco Metodologías Ágiles de Procesos de Desarrollo
c1d20e3	16/10/2026	Lautaa18	Agrego página de preguntas frecuentes y corrijo errores en celular
dfb5add	16/10/2026	Lautaa18	Agrego footer nuevo y saco la foto de Lautaro
2c84a72	28/09/2026	Lautaa18	Corrijo nombre del avatar
e7d433e	28/09/2026	Lautaa18	Corrijo avatar
1720b13	28/09/2026	Lautaa18	Agrego avatar animado
e9afae8	25/09/2026	Lautaa18	Agrego logo
66b08f8	25/09/2026	Lautaa18	Agrego nombres a sobre nosotros y avatar
a9d080b	25/09/2026	Lautaa18	Agrego secciones sobre nosotros y contacto
8562b2e	25/09/2026	Claude	Generar los perfiles del equipo desde un array en JS
81c9994	25/09/2026	Claude	Agregar páginas Sobre Nosotros y Contacto
cef638f	25/09/2026	Lautaa18	Merge branch master
b828010	25/09/2026	Lautaa18	Primer commit de scrumaticos
83d0433	25/09/2026	Lautaa18	Carga inicial (zip)

Archivo	Función
index.html	Inicio, historias de usuario, Sobre nosotros y Contacto
fundamentos.html	Fundamentos de calidad y pestañas ISO
agiles.html	Metodologías ágiles con índice
faq.html	Preguntas frecuentes
js/layout.js	Encabezado, menú y pie compartidos
js/main.js	Pestañas, acordeón, índice, perfiles y formulario
js/equipo.js	Datos del equipo
js/historias.js	Tarjetas de historias de usuario
css/styles.css	Estilos y diseño adaptable

8. Diseño e identidad visual

El diseño lo realizó Ezequiel en Figma Make. Combina fondos oscuros con violetas y lavandas; los títulos usan Fraunces (serif) y los textos, Outfit (sans serif).

Muestra	Color	HEX
	Fondo principal	#07051A
	Fondo secundario	#0D0A24
	Superficie	#16122F
	Violeta principal	#A874FF
	Lila	#C9BBFF
	Violeta de botones	#7B4FDB
	Violeta hover	#8C63E8
	Blanco lavanda	#F3F0FF
	Gris lavanda	#A9A5C4
	Verde de éxito	#3DD68C
	Rojo de error	#FF7A7A
	Violeta oscuro	#4C1DA8



Inicio con el menú desplegado.



Metodologías ágiles con el índice lateral.

9. Supuestos y datos a confirmar

Dato	Valor usado	Motivo
Puntos del Sprint 1	US-01 240, US-02 200, US-08 230, US-13 150, US-16 160, US-17 220	No figuraban en la entrega anterior; se usó la escala de la Pila del Sprint 2.
Fechas del Sprint 2	19/10 al 13/11/2026	No figuran en la Pila de Sprint; se tomó el lunes siguiente al cierre del Sprint 1 y 4 semanas.
Días del burndown	Días hábiles (lunes a viernes)	La bitácora registra días de clase.
Número de sprint	Sprint 1 y Sprint 2	La entrega anterior decía «sprint 5».

Anexo A. Historias de usuario y requerimientos

US-01 · Página de Inicio e Introducción General (240 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero ver la página de inicio para obtener una presentación general del sitio, una breve introducción a sus temas principales y un acceso rápido a las secciones más importantes.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de la portada (Hero section) con estructura responsive (Flexbox/Grid), paleta de colores coherente y tarjetas de navegación (cards) con accesos directos a las secciones principales.
- **JS:** Control del menú de navegación interactivo (menú hamburguesa dinámico en dispositivos móviles) y resaltado de la sección activa.
- **QA/Tester:** Validación de enlaces internos (sin URLs rotas) y verificación del renderizado correcto en distintas resoluciones (Desktop, Tablet, Mobile).

US-02 · Sección "Fundamentos de Calidad" (200 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero acceder a la sección "Fundamentos" para comprender los conceptos clave de calidad, métricas y estándares como ISO 9126/25000.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de contenido textual estructurado con tipografía legible, listas informativas y resaltado visual para conceptos clave y estándares ISO.
- **JS:** Implementación de pestañas (tabs) o acordeón dinámico para organizar los estándares (ISO 9126 vs. ISO 25000) sin sobrecargar la pantalla.
- **QA/Tester:** Verificación de ortografía, jerarquía de encabezados HTML (<h1>, <h2>, <h3>) y legibilidad en diferentes pantallas.

US-03 · Sección "Técnicas de Aseguramiento de la Calidad" (200 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a la sección "Técnicas de Aseguramiento de la Calidad" para conocer los tipos, niveles y técnicas de pruebas de software.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de esquemas gráficos o cuadros comparativos estilizados para diferenciar niveles (Unitarias, Integración, Sistema) y tipos de pruebas (Caja Negra, Caja Blanca).
- **JS:** Tarjetas interactivas desplegables (flip-cards o modales) que muestren detalles adicionales al hacer clic en cada tipo de prueba.
- **QA/Tester:** Pruebas de usabilidad para asegurar que los elementos desplegables funcionen correctamente tanto con clic del ratón como con eventos táctiles.

US-04 · Sección "Herramientas de Calidad" (220 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a la sección "Herramientas de Calidad" para obtener una introducción a herramientas de gestión de pruebas, seguimiento de defectos y análisis de calidad.

- **Diseño/CSS:** Grilla (grid) de tarjetas informativas visualmente atractivas con íconos representativos de cada tipo de herramienta (Bug Trackers, Linters, Test Management).
- **JS:** Sistema de filtrado por categoría de herramienta mediante botones interactivos en tiempo real sin recargar la página.
- **QA/Tester:** Validación de que los filtros oculten y muestren correctamente las tarjetas correspondientes según la categoría seleccionada.

US-05 · Sección "Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)" (220 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a la sección "Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)" para entender sus diferentes etapas y su importancia en la construcción de software.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de una línea de tiempo (timeline) vertical o horizontal que ilustre secuencialmente las etapas del SDLC (Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue, Mantenimiento).
- **JS:** Animación de desplazamiento (scroll smooth) o iluminación paso a paso de las etapas a medida que el usuario interactúa.
- **QA/Tester:** Verificación del comportamiento responsivo del timeline para evitar desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas.

US-06 · Sección "Modelos Tradicionales" (170 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero ver la sección de "Modelos Tradicionales" para aprender sobre el modelo en cascada, en V y los modelos iterativos e incrementales, incluyendo sus ventajas, desventajas y cuándo utilizarlos.

- **Diseño/CSS:** Estructuración de la información mediante bloques comparativos (Ventajas vs. Desventajas) utilizando íconos y cajas con códigos de color (ej. verde/rojo).
- **JS:** Navegación interna por sub-secciones dentro de la página para alternar rápidamente entre Cascada, Modelo en V e Iterativo.
- **QA/Tester:** Comprobación del correcto funcionamiento de los anclajes y la navegación interna.

US-07 · Ilustraciones de Modelos Tradicionales (180 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero ver imágenes o gráficos ilustrativos en la sección de Modelos Tradicionales para facilitar mi comprensión.

- **Diseño/CSS:** Optimización de formatos (SVG/WebP) y maquetación de contenedores de imagen adaptables con pie de foto explicativo.
- **JS:** Módulo de vista previa de imágenes en pantalla completa (Lightbox) al hacer clic sobre cualquier diagrama.
- **QA/Tester:** Verificación del atributo alt obligatorio en las imágenes para asegurar la accesibilidad web (WCAG) y validar tiempos de carga rápidos.

US-08 · Sección "Metodologías Ágiles" (230 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero acceder a la sección de "Metodologías Ágiles" para aprender sobre Scrum, Kanban y XP, sus principios, roles, ceremonias y artefactos.

- **Diseño/CSS:** Maquetación modular por metodología (Scrum, Kanban, XP) destacando los 4 valores y 12 principios del Manifiesto Ágil.
- **JS:** Menú flotante o tabla de contenidos dinámica para saltar de forma fluida a los apartados de Principios, Roles o Artefactos.
- **QA/Tester:** Revisión de la fidelidad del contenido respecto a la bibliografía del programa.

US-09 · Ilustraciones de Metodologías Ágiles (150 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero ver imágenes o gráficos ilustrativos en la sección de Metodologías Ágiles para facilitar mi comprensión.

- **Diseño/CSS:** Incorporación de esquemas visuales explicativos (ej. ciclo del Sprint, flujo Kanban, bucle de XP).

- **JS:** Reutilización del script de Lightbox/Galeria modal para ampliación de gráficos.
- **QA/Tester:** Prueba de escalabilidad visual en pantallas de alta densidad de píxeles (Retina/Full HD).

US-10 · Sección Profunda de Scrum (260 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a una descripción profunda de Scrum para entender en detalle sus roles, sprints, backlog, daily meetings, sprint review y sprint retrospective.

- **Diseño/CSS:** Maquetación estructurada por pestañas o bloques temáticos: 1) Roles, 2) Eventos/Ceremonias, 3) Artefactos.
- **JS:** Cronograma o diagrama interactivo del Sprint de 1 a 4 semanas donde el usuario pueda hacer clic en cada evento (Daily, Review, Retro) y ver su duración sugerida y objetivo.
- **QA/Tester:** Validación de la lógica interactiva del diagrama y comportamiento de interacción.

US-11 · Sección Profunda de Kanban (280 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a una sección que describa Kanban como una herramienta de gestión de procesos.

- **Diseño/CSS:** Maquetación que simule visualmente un tablero Kanban (Por Hacer, En Proceso, Hecho) explicativo con tarjetas informativas.
- **JS:** Demostración interactiva simple (drag-and-drop o botones) que permita al usuario mover una tarjeta didáctica a través de las columnas para entender el límite de WIP (Work in Progress).
- **QA/Tester:** Casos de prueba sobre el arrastre de elementos y persistencia visual del tablero en JS.

US-12 · Sección "Glosario" (210 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero acceder a un "Glosario" para encontrar definiciones de términos clave relacionados con la calidad y el desarrollo de software.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de listado alfabético (A-Z) accesible con separadores visuales claros.
- **JS:** Buscador en tiempo real (campo de entrada con filtro dinámico) que filtre las definiciones visibles según lo ingresado por el usuario, más índice interactivo por letras.
- **QA/Tester:** Pruebas del buscador con caracteres especiales, mayúsculas/minúsculas y términos inexistentes (pantalla "Sin resultados").

US-13 · Sección "Preguntas Frecuentes (FAQ)" (150 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero acceder a una sección de "Preguntas Frecuentes" para encontrar respuestas a las dudas más comunes.

- **Diseño/CSS:** Maquetación de interfaz tipo acordeón interactivo.
- **JS:** Lógica de apertura/cierre de respuestas mediante eventos de clic con animación fluida de altura CSS.
- **QA/Tester:** Verificar que la apertura de una pregunta no rompa el diseño ni oculte otros elementos de la página.

US-14 · Sección "Enlaces de Interés" (130 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero ver "Enlaces de Interés" para encontrar recursos externos, artículos, libros y organizaciones relevantes.

- **Diseño/CSS:** Listado de enlaces maquetados como tarjetas o listas estilizadas con íconos distintivos por tipo de recurso (Web, PDF, Libro, Organización).
- **JS:** Manejo de apertura segura de enlaces.

- **QA/Tester:** Validación de atributos target="_blank" y rel="noopener noreferrer" en los hipervínculos para seguridad y prevención de vulnerabilidades.

US-15 · Sección "Ejercicios y Casos Prácticos" (160 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero encontrar "Ejercicios y Casos Prácticos" para reforzar mi aprendizaje.

- **Diseño/CSS:** Tarjetas de ejercitación con bloques de enunciado y áreas desplegables para la solución/pauta de evaluación.
- **JS:** Botón interactivo "Mostrar/Ocultar Solución" con estado dinámico.
- **QA/Tester:** Comprobar que las soluciones permanezcan ocultas por defecto al cargar la página.

US-16 · Sección "Sobre Nosotros" (160 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero acceder a la sección "Sobre Nosotros" para encontrar información sobre el equipo y su motivación.

- **Diseño/CSS:** Layout de tarjetas de perfil para cada integrante del equipo (roles Scrum Master, Diseñador, Programador, Tester) con sus motivaciones e institución.
- **JS:** Efectos interactivos al pasar el cursor (hover) sobre los perfiles.
- **QA/Tester:** Control de calidad visual y alineación de elementos en pantalla.

US-17 · Formulario de Contacto (220 pts · Sprint 1)

Como usuario, quiero usar un "Formulario de Contacto" para enviar consultas o feedback.

- **Diseño/CSS:** Formulario accesible con etiquetas <label> vinculadas a cada campo (input, textarea).
- **JS:** Validación del lado del cliente antes del envío (validación de campos obligatorios, formato correcto de correo electrónico). Mensaje de confirmación en pantalla al presionar "Enviar".
- **QA/Tester:** Pruebas de frontera: enviar campos vacíos, correos con sintaxis inválida o textos con caracteres especiales para verificar las alertas de error.

US-18 · Comparador Interactivo de Metodologías (380 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero usar un "Comparador de Metodologías" interactivo para seleccionar dos o más metodologías y ver una tabla comparativa con sus características clave.

- **Diseño/CSS:** Formulario de selección por checkboxes y contenedor de tabla adaptativa con bordes e indicadores claros.
- **JS:** Renderizado dinámico de columnas/filas en la tabla comparativa mediante lectura de un objeto/arreglo en JS con las características de cada metodología según la selección activa del usuario.
- **QA/Tester:** Matriz de pruebas para validar que al seleccionar/deseleccionar elementos la tabla se cree y limpie sin arrojar errores por consola.

US-19 · Encuesta de Preferencias Metodológicas (400 pts · Sprint 2)

Como usuario, quiero usar una "Encuesta de Preferencias Metodológicas" para responder preguntas sobre un proyecto y obtener una sugerencia sobre qué metodología es la más adecuada.

- **Diseño/CSS:** Componente tipo asistente/paso a paso (Wizard) con barra de progreso visual.
- **JS:** Algoritmo de cómputo de puntaje que evalúa las alternativas seleccionadas en el formulario y calcula el porcentaje de coincidencia hacia Scrum, Kanban o Cascada, presentando un resumen final dinámico.

- **QA/Tester:** Ejecución de casos de prueba con diferentes rutas de respuesta para asegurar la precisión del resultado arrojado por el algoritmo.

Anexo B. Regresión automatizada del Sprint 1

Ejecutada el 06/11/2026 con Playwright sobre la copia local del repositorio.

ID	Caso	Resultado
US1-1	Menú se abre	Aprobado
US1-3	Menú se cierra con Esc y el foco vuelve	Aprobado
US1-4	Menú se cierra con click afuera	Aprobado
US1-6	Un solo submenú abierto a la vez	Aprobado
US1-13	Ítems sin página se ven como Próximamente sin enlace	Aprobado
US1-21	Portada con título y 6 tarjetas	Aprobado
US1-22	No hay enlaces internos rotos	Aprobado
US1-23	Sin scroll horizontal a 1280px	Aprobado
US1-24	Sin scroll horizontal a 768px	Aprobado
US1-20	Sin scroll horizontal a 375px	Aprobado
US2-1	Pestaña inicial ISO 9126 y un panel visible	Aprobado
US2-5	Siempre una sola pestaña activa	Aprobado
US2-6	Flecha derecha cicla pestañas	Aprobado
US2-8	Teclas Inicio/Fin	Aprobado
US2-16	Un solo h1 en Fundamentos	Aprobado
US8-3	12 principios del Manifiesto	Aprobado
US8-10	Índice lleva a Scrum sin quedar tapado	Aprobado
US8-12	Scrollspy marca Kanban	Aprobado
US8-17	Un solo h1 en Metodologías ágiles	Aprobado
US13-2	Todas las preguntas cerradas al cargar	Aprobado
US13-3	Abrir una pregunta	Aprobado
US13-5	Grupo "una por vez" cierra la anterior	Aprobado
US13-8	Acordeón con teclado (Enter)	Aprobado
US13-12	Un solo h1 en FAQ	Aprobado
US16-2	4 perfiles del equipo	Aprobado
US16-4	Hover agrega la luz	Aprobado
US17-2	Enviar vacío muestra 4 errores	Aprobado
US17-4	Email inválido	Aprobado
US17-9	Límite de 500 caracteres	Aprobado
US17-11	Envío correcto muestra agradecimiento	Aprobado
US17-13	Cada campo tiene etiqueta vinculada	Aprobado

ID	Caso	Resultado
GEN	Sin errores en la consola	Aprobado

Anexo C. Resultados de pruebas del Sprint 2

ID	Caso	Resultado
US3-1	que cargue la página Técnicas de QA	Aprobado
US3-2	el esquema de niveles de prueba	Aprobado
US3-3	el cuadro de tipos de prueba	Aprobado
US3-4	abrir una tarjeta con el mouse	Aprobado
US3-5	cerrar la tarjeta	Aprobado
US3-6	cerrar el modal con la tecla Esc	Aprobado
US3-7	todas las tarjetas	Aprobado (7 tarjetas, cada una con su detalle)
US3-8	abrir una tarjeta con el dedo	Aprobado
US3-9	las tarjetas con teclado	Aprobado
US3-10	la página en celular	Aprobado
US4-1	que cargue la página Herramientas	Aprobado
US4-2	las tarjetas de la grilla	Aprobado
US4-3	el filtro que se ve al cargar	Aprobado
US4-4	el filtro Bug Trackers	Aprobado (3 tarjetas)
US4-5	el filtro Linters	Aprobado (3 tarjetas)
US4-6	el filtro Test Management	Aprobado (3 tarjetas)
US4-7	volver a ver todas	Aprobado
US4-8	el botón activo	Aprobado
US4-9	que no se recargue la página	Aprobado
US4-10	que no haya errores	Aprobado
US4-11	la grilla en celular	Aprobado
US5-1	que cargue la página SDLC	Aprobado
US5-2	el orden de las etapas	Aprobado
US5-3	la iluminación de las etapas	Aprobado
US5-4	el click en una etapa	Aprobado
US5-5	el desplazamiento suave	Aprobado (Desplazamiento en 6 muestras, gradual)
US5-6	el contenido de cada etapa	Aprobado
US5-7	la línea de tiempo en escritorio	Aprobado
US5-8	la línea de tiempo en tablet	Aprobado
US5-9	la línea de tiempo en celular	Aprobado (Vertical, sin desbordar)

ID	Caso	Resultado
US6-1	que cargue la página Modelos Tradicionales	Aprobado
US6-2	el contenido de Cascada	Aprobado
US6-3	el contenido del Modelo en V	Aprobado
US6-4	el contenido de Iterativo e Incremental	Aprobado
US6-5	las cajas de colores	Aprobado (Ventajas rgb(243, 240, 255), desventajas rgb(243, 240, 255), con íconos ✓/✕)
US6-6	el link Cascada del menú interno	Aprobado
US6-7	el link Modelo en V del menú interno	Aprobado
US6-8	el link Iterativo del menú interno	Aprobado
US6-9	entrar directo a un modelo	Aprobado
US6-10	la página en celular	Aprobado
US7-1	que estén las ilustraciones	Aprobado
US7-2	el formato de las imágenes	Aprobado
US7-3	el atributo alt	Aprobado
US7-4	el pie de foto	Aprobado
US7-5	el tiempo de carga	Aprobado (57 ms; SVG de 2.1, 3.5, 4.7 KB)
US7-6	abrir el Lightbox	Aprobado (Imagen ampliada de 531 a 1200 px)
US7-7	cerrar el Lightbox con la X	Aprobado
US7-8	cerrar el Lightbox con Esc o click afuera	Aprobado
US7-9	las imágenes en celular	Aprobado
US9-1	el esquema del ciclo del Sprint	Aprobado
US9-2	el esquema del flujo Kanban	Aprobado
US9-3	el esquema del bucle de XP	Aprobado
US9-4	abrir un esquema en el Lightbox	Aprobado
US9-5	cerrar el Lightbox	Aprobado
US9-6	los esquemas en pantalla Full HD	Aprobado
US9-7	los esquemas en pantalla de alta densidad	Aprobado (Vectoriales (SVG): sin pixelado a 2x)
US9-8	el atributo alt	Aprobado
US9-9	los esquemas en celular	Aprobado
US10-1	que cargue la página Scrum	Aprobado
US10-2	la pestaña que se ve al cargar	Aprobado
US10-3	la pestaña Roles	Aprobado
US10-4	la pestaña Eventos/Ceremonias	Aprobado
US10-5	la pestaña Artefactos	Aprobado

ID	Caso	Resultado
US10-6	que haya una sola pestaña seleccionada	Aprobado
US10-7	el evento Daily del diagrama	Aprobado
US10-8	el evento Review del diagrama	Aprobado (Duración: hasta 2 horas)
US10-9	el evento Retro del diagrama	Aprobado (Duración: hasta 1 hora y 30 minutos)
US10-10	el Sprint de 1 semana	Aprobado (Review hasta 1 hora, Retro hasta 45 minutos)
US10-11	el Sprint de 4 semanas	Aprobado (Review hasta 4 horas, Retro hasta 3 horas)
US10-12	cambiar de evento	Aprobado
US10-13	que no haya errores	Aprobado
US10-14	la página en celular	Aprobado
US11-1	que cargue la página Kanban	Aprobado
US11-2	las columnas del tablero	Aprobado
US11-3	mover una tarjeta a En Proceso	Aprobado
US11-4	mover una tarjeta a Hecho	Aprobado
US11-5	el límite de WIP	Aprobado (Aviso: Límite WIP alcanzado: "En proceso" admit...)
US11-6	liberar lugar en En Proceso	Aprobado
US11-7	soltar la tarjeta afuera	Aprobado
US11-8	los contadores de columna	Aprobado (Contadores 0, 2 / 2, 3)
US11-9	que el tablero mantenga su estado	Aprobado (Se mantiene incluso al recargar)
US11-10	el tablero en celular	Aprobado
US11-11	que no haya errores	Aprobado
US12-1	que cargue la página Glosario	Aprobado
US12-2	el orden alfabético	Aprobado (41 términos en 20 letras)
US12-3	buscar un término	Aprobado (Sprint)
US12-4	la búsqueda en tiempo real	Aprobado (Resultados: 24 → 7 → 1)
US12-5	mayúsculas y minúsculas	Aprobado
US12-6	palabras con tilde	Aprobado
US12-7	caracteres especiales	Aprobado
US12-8	un término que no existe	Aprobado
US12-9	borrar la búsqueda	Aprobado
US12-10	el índice por letras	Aprobado
US12-11	letras sin términos	Aprobado (6 letras atenuadas sin enlace (G J N O Y Z))
US12-12	el glosario en celular	Aprobado
US14-1	que cargue la página Enlaces de Interés	Aprobado

ID	Caso	Resultado
US14-2	los íconos por tipo de recurso	Aprobado (Tipos: Sitio web, Organización, PDF, Libro)
US14-3	el atributo target	Aprobado
US14-4	el atributo rel	Aprobado
US14-5	abrir un enlace	Aprobado (Pestaña nueva, sin window.opener; el sitio sigue abierto)
US14-6	que no haya enlaces rotos	Pendiente (manual)
US14-7	las tarjetas en celular	Aprobado
US15-1	que cargue la página Ejercicios	Aprobado
US15-2	que las soluciones estén ocultas	Aprobado
US15-3	mostrar una solución	Aprobado
US15-4	ocultar la solución	Aprobado
US15-5	que cada botón abra su solución	Aprobado
US15-6	recargar la página	Aprobado
US15-7	el botón con teclado	Aprobado
US15-8	las tarjetas en celular	Aprobado
US18-1	que cargue el comparador	Aprobado
US18-2	sin ninguna metodología elegida	Aprobado
US18-3	con una sola metodología	Aprobado
US18-4	con dos metodologías	Aprobado (Columnas Cascada, Scrum; 8 características)
US18-5	con tres metodologías	Aprobado
US18-6	con todas las metodologías	Aprobado
US18-7	desmarcar una metodología	Aprobado
US18-8	desmarcar todas	Aprobado
US18-9	que los datos sean correctos	Aprobado (48 celdas coinciden con el arreglo METODOLOGIAS)
US18-10	marcar y desmarcar rápido	Aprobado (15 clics seguidos: sin columnas repetidas)
US18-11	que no haya errores	Aprobado
US18-12	la tabla en celular	Aprobado (La tabla se desplaza dentro de su caja)
US19-1	que cargue la encuesta	Aprobado
US19-2	la barra de progreso	Aprobado (Progreso: 17 → 33 → 50 → 67 → 83 → 100 %)
US19-3	avanzar sin responder	Aprobado
US19-4	el botón Anterior	Aprobado
US19-5	la ruta hacia Cascada	Aprobado (scrum 12 %, kanban 16 %, cascada 72 %)
US19-6	la ruta hacia Scrum	Aprobado (scrum 72 %, kanban 24 %, cascada 4 %)

ID	Caso	Resultado
US19-7	la ruta hacia Kanban	Aprobado (scrum 18 %, kanban 78 %, cascada 4 %)
US19-8	respuestas mezcladas	Aprobado (Mezcla: scrum:35,kanban:38,cascada:27; destacada kanban)
US19-9	la suma de porcentajes	Aprobado (Suma 100 % (verificado en las 729 combinaciones))
US19-10	repetir la misma ruta	Aprobado
US19-11	volver a empezar	Aprobado
US19-12	que no haya errores	Aprobado
US19-13	la encuesta en celular	Aprobado
